DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)

CHỦ ĐẦU TƯ	TƯ VẤN GIÁM SÁT	NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN	LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ	LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM

BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN

Người lập: Tên mốc:
Thời tiết: Cao độ mốc:
Lý trình: Km118+410 Ngày đặt bàn: 20/05/2024
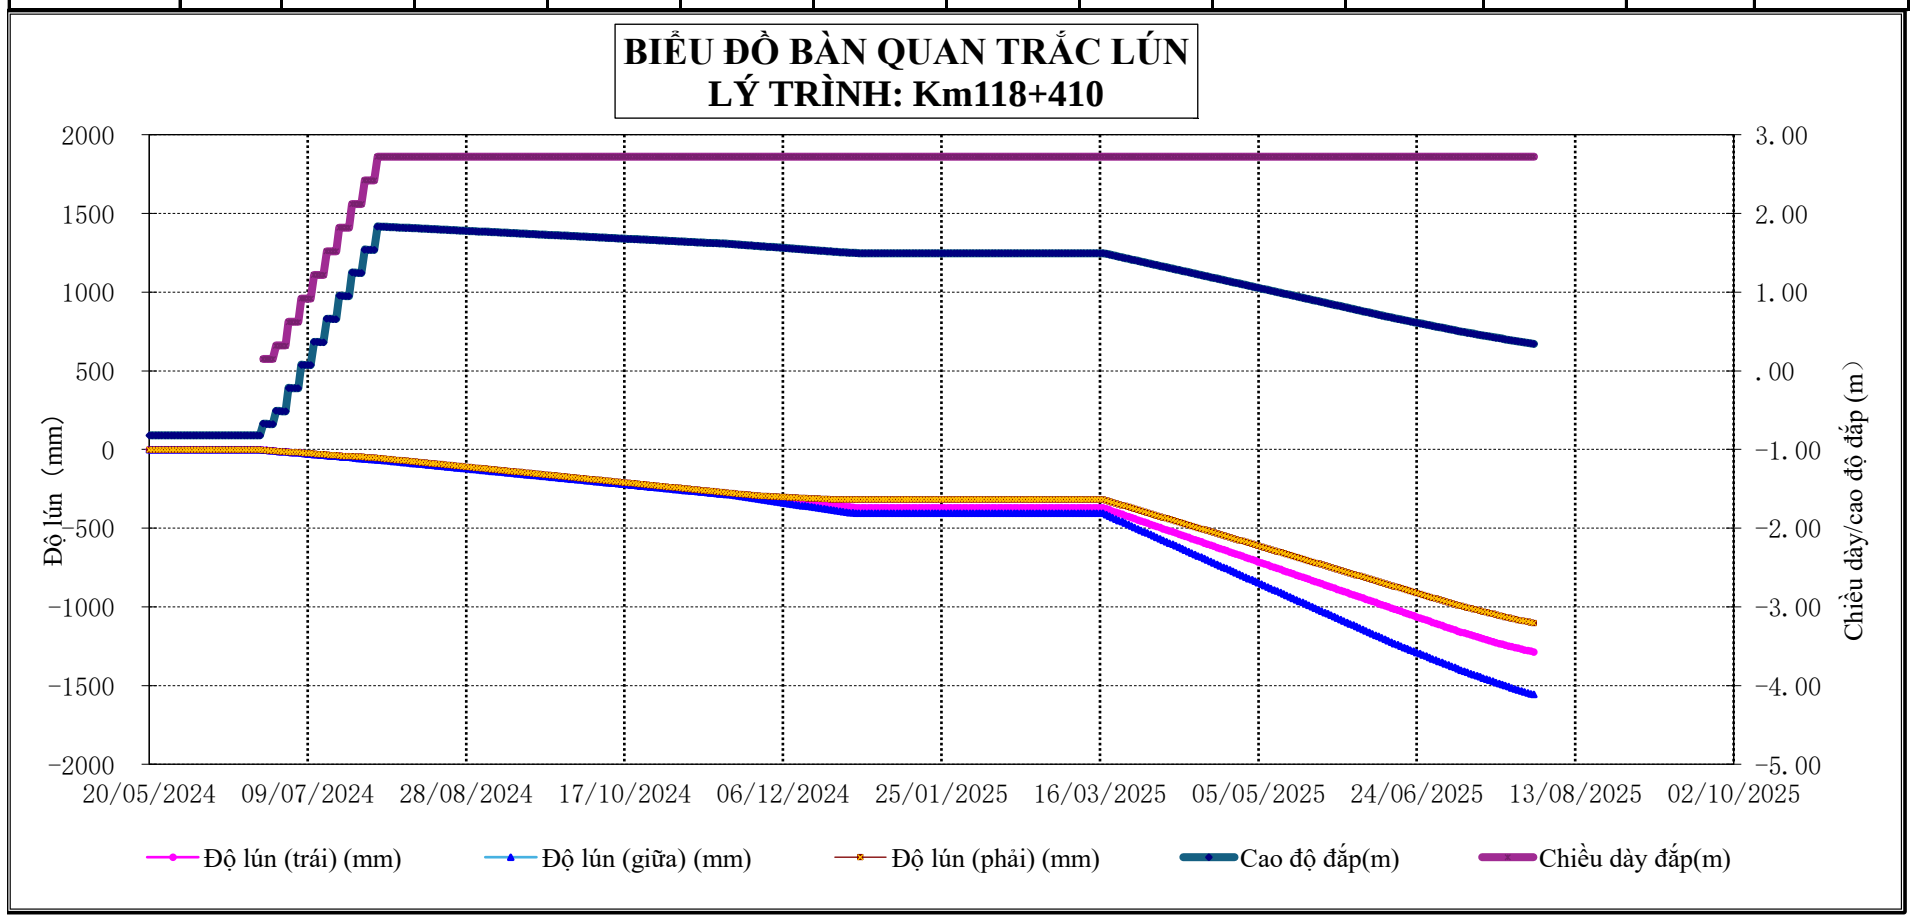
Ngày đo	Số ngày	Cao độ đắp(m)	Chiều dày đắp(m)	Trái		Giữa		Phải		Độ lún (trái) (mm)	Độ lún (giữa) (mm)	Độ lún (phải) (mm)	Ghi chú
				Cao độ quan trắc	Cao độ bàn đo lún	Cao độ quan trắc	Cao độ bàn đo lún	Cao độ quan trắc	Cao độ bàn đo lún				
20/05/2024	0	-0.820		1.150	-0.850	1.180	-0.820	1.250	-0.750	0	0	0	
01/07/2025	407	0.555	2.72	1.038	-1.962	0.835	-2.165	1.297	-1.703	-1112	-1345	-953	
02/07/2025	408	0.547	2.72	1.031	-1.969	0.827	-2.173	1.291	-1.709	-1119	-1353	-959	
03/07/2025	409	0.539	2.72	1.024	-1.976	0.819	-2.181	1.285	-1.715	-1126	-1361	-965	
04/07/2025	410	0.531	2.72	1.017	-1.983	0.811	-2.189	1.279	-1.721	-1133	-1369	-971	
05/07/2025	411	0.523	2.72	1.010	-1.990	0.803	-2.197	1.273	-1.727	-1140	-1377	-977	
06/07/2025	412	0.515	2.72	1.003	-1.997	0.795	-2.205	1.267	-1.733	-1147	-1385	-983	
07/07/2025	413	0.507	2.72	0.996	-2.004	0.787	-2.213	1.261	-1.739	-1154	-1393	-989	
08/07/2025	414	0.499	2.72	0.990	-2.010	0.779	-2.221	1.256	-1.744	-1160	-1401	-994	
09/07/2025	415	0.491	2.72	0.984	-2.016	0.771	-2.229	1.251	-1.749	-1166	-1409	-999	
10/07/2025	416	0.484	2.72	0.978	-2.022	0.764	-2.236	1.246	-1.754	-1172	-1416	-1004	
11/07/2025	417	0.477	2.72	0.972	-2.028	0.757	-2.243	1.241	-1.759	-1178	-1423	-1009	
12/07/2025	418	0.470	2.72	0.966	-2.034	0.750	-2.250	1.236	-1.764	-1184	-1430	-1014	
13/07/2025	419	0.463	2.72	0.960	-2.040	0.743	-2.257	1.231	-1.769	-1190	-1437	-1019	
14/07/2025	420	0.456	2.72	0.954	-2.046	0.736	-2.264	1.226	-1.774	-1196	-1444	-1024	
15/07/2025	421	0.449	2.72	0.948	-2.052	0.729	-2.271	1.221	-1.779	-1202	-1451	-1029	
16/07/2025	422	0.442	2.72	0.942	-2.058	0.722	-2.278	1.216	-1.784	-1208	-1458	-1034	
17/07/2025	423	0.435	2.72	0.936	-2.064	0.715	-2.285	1.211	-1.789	-1214	-1465	-1039	
18/07/2025	424	0.428	2.72	0.930	-2.070	0.708	-2.292	1.206	-1.794	-1220	-1472	-1044	
19/07/2025	425	0.421	2.72	0.924	-2.076	0.701	-2.299	1.201	-1.799	-1226	-1479	-1049	
20/07/2025	426	0.414	2.72	0.918	-2.082	0.694	-2.306	1.196	-1.804	-1232	-1486	-1054	
21/07/2025	427	0.407	2.72	0.912	-2.088	0.687	-2.313	1.191	-1.809	-1238	-1493	-1059	
22/07/2025	428	0.400	2.72	0.907	-2.093	0.680	-2.320	1.186	-1.814	-1243	-1500	-1064	
23/07/2025	429	0.393	2.72	0.902	-2.098	0.673	-2.327	1.181	-1.819	-1248	-1507	-1069	
24/07/2025	430	0.386	2.72	0.897	-2.103	0.666	-2.334	1.176	-1.824	-1253	-1514	-1074	
25/07/2025	431	0.379	2.72	0.892	-2.108	0.659	-2.341	1.172	-1.828	-1258	-1521	-1078	
26/07/2025	432	0.372	2.72	0.887	-2.113	0.652	-2.348	1.168	-1.832	-1263	-1528	-1082	
27/07/2025	433	0.366	2.72	0.882	-2.118	0.646	-2.354	1.164	-1.836	-1268	-1534	-1086	
28/07/2025	434	0.360	2.72	0.877	-2.123	0.640	-2.360	1.160	-1.840	-1273	-1540	-1090	
29/07/2025	435	0.354	2.72	0.873	-2.127	0.634	-2.366	1.156	-1.844	-1277	-1546	-1094	
30/07/2025	436	0.349	2.72	0.869	-2.131	0.629	-2.371	1.152	-1.848	-1281	-1551	-1098	
31/07/2025	437	0.344	2.72	0.865	-2.135	0.624	-2.376	1.149	-1.851	-1285	-1556	-1101
